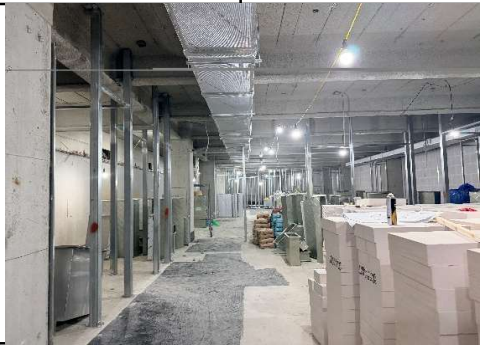


하이드라오 한국 5호점(영등포점) 프로젝트 공사 시공일지 (2026년 05월 25일)					
프로젝트 정보					
프로젝트 명	하이드라오 한국 5호점(영등포점)				
프로젝트 주소	서울시 영등포구 영중로 28 점프밀라노 5층				
지역 매니저	윤대진		매장 매니저	김설화	
공사 감독	웨이중롱		설계 지도	웨이중롱	
관리회사	전과건축공정유한공사	관리회사 책임자	쑤팅페이	관리회사 현장 책임자	치엔치장
시공업체	SENOORI ARCHITECTURE CO., LTD.	시공업체 책임자	이응진	시공업체 현장 책임자	김창민
착공일	2026년 4월 15일		준공일	2026년 8월 15일	
단계별 중요 일정			완료 시간		
오늘 시공 내용	현장청소/폐기물처리, 벽체배관安工程, 방수공시공, 덕트系배관工程, 전기설비배선				
시공일지					
공종	인원수	시공 내용			
관리인원	5	확인현장 , 도면 / 발주처 지급자재核算数量			
번역	1	현장接/번역材料			
직영반장	2	현장청소/폐기물처리 / 材料			
금속공	5	벽체배관安工程			
목공					
전기공	8	전기설비배선 / 자재吊			
보양공					
미장공					
덕트공(급기·배기)	6	배기 / 新덕트道安			
조적공					
단열공					
방수공	3	화장실外/바닥液방수공			
배관공(수도공)					
비계공					
경량철골공					
금일 총 시공 인원	30명				

특이사항					
프로젝트 사진					
프로젝트 단계			완료 시간		
단계별 진척도			단계별 진척율		
위치			설명		
					
방수공사공		홀(객석)		방수공사공	
					
방수공사공		방수공사공		废料清运	
발주처 지급품 분류 통계표 (日如有발주처 지급품到需拍照)					
일련번호	분류	발주처 지급품	도착 시간	도착 여부	설치 여부
1					
2					
3					
4					
5					
7					
8					
9					
시공단계 중요일정 점검 (日시공단계별 중요 일정需)					
중요 일정			점검자		
